

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE
L'AGRICULTURE

MINISTERE DE
L'ELEVAGE ET
DE LA PÊCHE

COMMISSARIAT
A LA SECURITE
ALIMENTAIRE

SECRETARIAT
D'ETAT A L'OFFICE
DU NIGER

CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE



**RAPPORT DE LA 12ème REVUE DES
PROJETS ET PROGRAMMES DU SECTEUR DU
DEVELOPPEMENT RURAL**

Jun 2012

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
INTRODUCTION GENERALE.....	4
1. CONTEXTE.....	6
2. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION DE LA 10 ^{ème} REVUE Erreur ! Signet non défini.	
3. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES P/P DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU'AU AU 31/12/2011.	6
3.1. Situation générale des P/P	6
3.2. Progression des financements acquis du portefeuille des PP du Ministère de l'Agriculture de 2007 à 2010.....	8
3.3. Répartition des financements acquis:	10
3.3.1. Répartition du portefeuille par type de financement:.....	10
3.3.2. Evolution de la répartition du portefeuille par type de financement :.....	11
3.4. Répartition des projets et programmes par tutelle	12
3.5. Répartition par tutelle des financements acquis des projets et programmes.....	12
3.5.1. Répartition des financements acquis 2010 par tutelle :	12
3.5.2. Evolution des financements acquis par tutelle de 2007 à 2010:.....	14
3.6. Répartition des P/P selon leur niveau d'exécution	15
3.7. Situation des décaissements :	16
3.7.1. Évolution du taux de décaissement entre 2008 et 2011	17
3.7.2. Décaissement 2009.....	19
3.7.3. Au titre du décaissement intérieur	20
3.7.4. Au titre du décaissement extérieur	20
3.8. L'âge des P/P :	21
4. CONTRAINTES.....	22
5. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	22
6. PLAN D'ACTION DE LA 10 ^{ème} REVUE..... Erreur ! Signet non défini.	
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.....	22
8. ANNEXES.....	22
8.1. Annexe 1 : répartition des financements par projet/ programme par bailleur et par région	23

Liste des tableaux et figures

FIGURE 1 : PROGRESSION DES FINANCEMENTS ACQUIS DU MA DE 2006 A 2011	8
FIGURE 42 : PROGRESSION DES FINANCEMENTS ACQUIS DU MDDIZON DE 2006 A 2011	9
FIGURE 3 : PROGRESSION DES FINANCEMENTS ACQUIS DU SDR DE 2006 A 2011	9
FIGURE 4 : REPARTITION DES FINANCEMENTS ACQUIS DU PORTEFEUILLE 2011	10
FIGURE 5 : EVOLUTION DE LA REPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR TYPE DE FINANCEMENT ENTRE 2008 ET 2011	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
FIGURE 7 : REPARTITION DES P/P PAR TUTELLE	12
FIGURE 8 : REPARTITION DES VOLUMES DE FINANCEMENT ACQUIS DES P/P DU SDR PAR STRUCTURE.....	13
FIGURE 9 : EVOLUTION DES FINANCEMENTS ACQUIS CUMULES DE 2006 A 2011 PAR TUTELLE	14
FIGURE 10 : REPARTITION PAR DEPARTEMENT DES P/P SELON LEUR NIVEAU D'EXECUTION	15
FIGURE 11 : REPARTITION DES P/P SELON LEUR NIVEAU D'EXECUTION EN %	16
FIGURE 12 : ÉVOLUTION DES VOLUMES DE DECAISSEMENT ENTRE 2008 ET 2010	17
FIGURE 13 : EVOLUTION DU TAUX DE DECAISSEMENT GLOBAL ENTRE 2008 ET 2009	18
FIGURE 14 : EVOLUTION DU TAUX DE DECAISSEMENT PAR DEPARTEMENT ENTRE 2008 ET 2011 EN %	18
FIGURE 15 : COMPARAISON DU DECAISSEMENT CUMULE ET DECAISSEMENT 2010 ENTRE DEPARTEMENT DU SDR	20
FIGURE 16 : REPARTITION DES P/P PAR AGE	21

INTRODUCTION GENERALE

Par lettre circulaire N°00841/MEF-SG du 24 février 2012, relative à la 12^{ème} revue des projets et programmes de Développement du Mali, le Ministre de l'Economie et des Finances a demandé à chaque département ministériel d'élaborer un rapport sur l'état d'exécution du portefeuille des projets et programmes publics de développement au 31 Décembre 2011. Cette lettre est accompagnée d'une note méthodologique qui précise le chronogramme de la revue.

Il s'agit de procéder à une analyse critique de l'état d'exécution physique et financière desdits projets et programmes, d'identifier les principales contraintes qui entravent leur mise en œuvre et de proposer les mesures et/ou solutions nécessaires pour améliorer leur performance.

L'analyse du Secteur du Développement Rural révèle que d'importants efforts ont été faits à travers l'élaboration d'une Loi d'Orientation Agricole (LOA), prenant en compte les différents Schémas et politiques, notamment la Politique de Développement Agricole et son Programme National d'Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA). Cent vingt six (126) projets et programmes sont mis en œuvre dans le Secteur du Développement Rural. Ils sont généralement financés à environ 78% par l'aide extérieure.

Compte tenu des enjeux et face à l'ampleur des investissements consentis, le suivi de ces projets et programmes s'avère indispensable afin de s'assurer de leur gestion efficace et efficiente et d'apporter éventuellement les mesures correctives nécessaires.

Le suivi opérationnel est du ressort des structures chargées de l'exécution de ces projets et programmes. Des supervisions périodiques sont effectuées par les services centraux assurant la tutelle de ces projets ainsi que les bailleurs de fonds. Toutefois, les informations collectées ne parviennent pas à temps aux décideurs, limitant ainsi leurs capacités d'anticipation par rapport aux solutions à apporter aux éventuelles difficultés liées à l'exécution normale des projets et programmes. Cette situation n'est pas satisfaisante aussi bien pour les bénéficiaires, le département, que pour les partenaires au développement.

Pour pallier cette insuffisance, il a été créé onze (11) Cellules de Planification et de Statistique (CPS) sectorielles, disposant en leur sein d'une Unité de Programmation et de Suivi Evaluation dont une des missions est d'élaborer un rapport annuel d'exécution des projets et programmes du secteur concerné. La CPS en charge du Secteur du Développement Rural est la CPS-SDR, couvrant le Ministère de l'Agriculture, le Ministère de l'Elevage et de la Pêche, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et le Ministère Délégué chargé du développement intégré de la zone office du Niger (MDDIZON).

La 12^{ème} revue du SDR a porté sur 126 Projets et Programmes, tirés du Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2011-2013, dont 118 sont en exécution et 8 en préparation. Toutefois, en vue de fournir aux décideurs une information actualisée du portefeuille des projets et programmes du SDR, les financements extérieurs acquis par les projets et programmes clos au 31 Décembre 2010 n'ont pas été comptabilisés.

Par ailleurs, compte tenue des conditions particulièrement difficiles de réalisation de la 12^{ème} revue, il n'a pas été possible de conduire la phase de collecte d'information au près des P/P sur le terrain. Ainsi il n'a pas été possible d'élargir le champ aux sources habituellement considérées lors de la 10^{ème} et 11^{ème} revue du SDR (la DNPD pour les P/P intervenant dans le secteur Agricole et sous tutelle d'autres départements en dehors du SDR, la loi des finances pour certains P/P répertoriés à la primature, la matrice de P/P élaborée par USAID et celle du Ministère des Affaires Etrangères).

Le présent rapport se compose des chapitres ci-après :

- Le contexte ;

- L'état d'exécution du portefeuille des Projets/Programmes depuis leur démarrage jusqu'au 31/12/2011 ;
- L'état des projets et programmes en préparation ;
- Les contraintes de mise en œuvre des projets et programmes ;
- Les propositions de mesures et/ou solutions pour lever les contraintes identifiées;
- Le plan d'action de la 12^{ème} Revue ;
- Les conclusions et recommandations ;
- Les annexes.

1. CONTEXTE

L'environnement du Secteur de Développement Rural est marqué par :

- La création du MDDIZON ;
- Le processus de passage à l'approche sectorielle.

2. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES P/P DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU'AU AU 31/12/2011.

2.1. Situation générale des P/P

Le portefeuille du SDR regroupe 126 projets et programmes, dont 118 en exécution et 8 en préparation. 89 projets et programmes sont inscrits au Répertoire National des Projets (RNP). 37 Projets et Programmes attendent d'être inscrits au RNP. Voir tableau de synthèse ci-dessous. La situation détaillée est jointe en Annexe 1.

Tableau 1 : tableau de synthèse générale

	Nbr e	Financement Acquis cumulés 31/12/2011			Décaissements cumulés 31/12/2011			Taux cumulés 31/12/2011		
		Int.	Ext.	Total	Int.	Ext.	Total	Int.	Ext.	Total
Ministère de l'Agriculture										
Projet en exécution	63	100,221	435,223	535,444	57,826	187,009	244,835	0	0	0
Projet en préparation	4	250	7,804	8,054	0	0	0	0	0	0
Total Ministère de l'Agriculture	67	100471	443,027	543,498	57826	187009.1	244,835	57.55%	42.21%	45.05%
Ministère de l'Élevage et de la Pêche										
Projet en exécution	34	37,728	73,064	110,792	27,563	26,896	54,419	0	0	0
Projet en préparation	2	250	1,640	1,890	0	0	0	0	0	0
Total MEP	36	37978	74704.2	112,682	27563	26896.35	54,459	72.58%	36.00%	48.33%
Commissariat à la sécurité alimentaire										
Projet en exécution	9	7,220	34,847	42,067	3,835	14,994	18,829	0	0	0
Projet en préparation		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total CSA	9	7220	34847	42,067	3835	14993.66	18,829	53.12%	43.03%	44.76%
MDDIZON										
Projet en exécution	12	33,290	77,246	110,536	16,127	15,594	31,721	0	0	0
Projet en préparation	2	1,633	12,259	13,892	0	0	0	0	0	0
Total MDDIZON	14	34923	89505	124,428	16127	15594	31,721	46.18%	17.42%	25.49%
TOTAL SDR										
Projet en exécution	118	178,459	620,380	798,839	105,351	244,493	349,804	59.03%	39.41%	43.79%
Projet en préparation	8	2133	21703	23836	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Total Global SDR	126	180592	642083	822675	105351	244493	349804	58.34%	38.08%	42.52%

Situation des décaissements réalisés au cours de l'année 2011

		Décaissement 2011		
Ministère de l'Agriculture	Nombre	Intérieur	Extérieur	Total
Projet en exécution	63	8,011	22,566	30,576
Projet en préparation	4	0	0	0
Total Ministère de l'Agriculture	67	8,011	22,566	30,576
Ministère de l'Elevage et de la Pêche		0	0	0
Projet en exécution	34	5,137	4,963	10,060
Projet en préparation	2	0	0	0
Total MEP	36	4,560	4,686	9,246
Commissariat à la sécurité alimentaire		0	0	0
Projet en exécution	9	1,634	3,888	5,522
Projet en préparation		0	0	0
Total CSA	9	1,634	3,888	5,522
MDDIZON		0	0	0
Projet en exécution	12	7,179	2,323	9,502
Projet en préparation	2	-400	-1,614	-2,014
Total MDDIZON	14	6,779	709	7,488
		0	0	0
TOTAL SDR		0	0	0
Projet en exécution	118	21,961	33,740	55,660
Projet en préparation	8	0	0	0
Total Global SDR	126	20,984	31,849	52,792

Le décaissement 2011 a été obtenu par la différence entre le décaissement cumulé au 31/12/2011 moins le décaissement cumulé au 31/12/2010.

2.2. Progression des financements acquis du portefeuille des PP du Ministère de l'Agriculture de 2007 à 2010

Le financement total acquis (intérieur et extérieur) du portefeuille des projets et programmes du SDR au 31 décembre 2011 est de 822,675 milliards de Fcfa contre 705,449 milliards de Fcfa au 31 décembre 2010, soit une augmentation de 16,6%.

Le détail est donné dans le tableau N°2 et dans la figure N°1 ci-dessous.

Tableau 2 : Progression des financements acquis du portefeuille des PP (en millions de F CFA)

Année	MA	MEP	CSA	MDDIZON	SDR
31/12/06	378,029	65,866	49,395	0	493,290
31/12/07	386,292	77,975	52,312	0	516,579
31/12/08	601,263	94,893	39,552	0	735,708
31/12/09	557,972	93,464	43,827	132,840	828,104
31/12/10	450,883	100,370	40,792	113,404	705,449
12/12/11	543,498	112,682	42,067	124,428	822,675

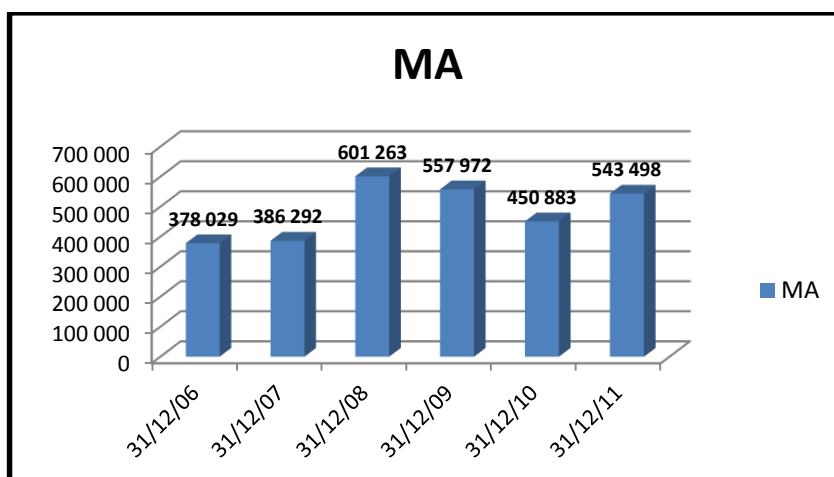


Figure 1 : progression des financements acquis du MA de 2006 à 2011

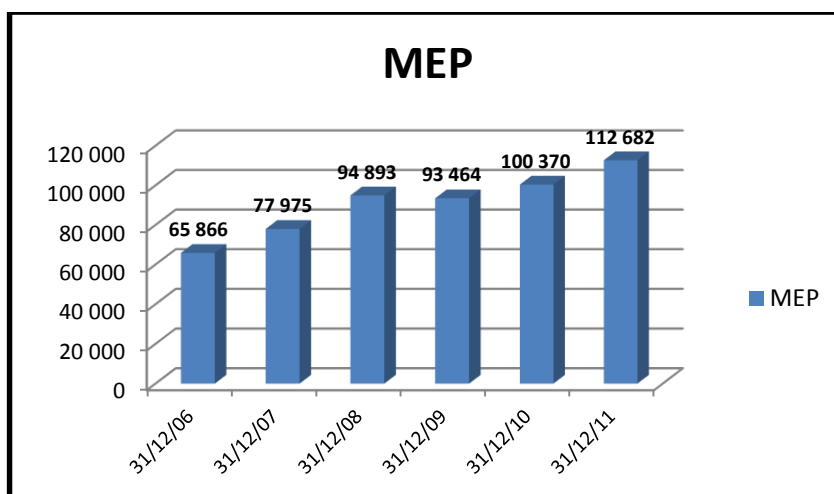


Figure 2 : progression des financements acquis du MEP de 2006 à 2011

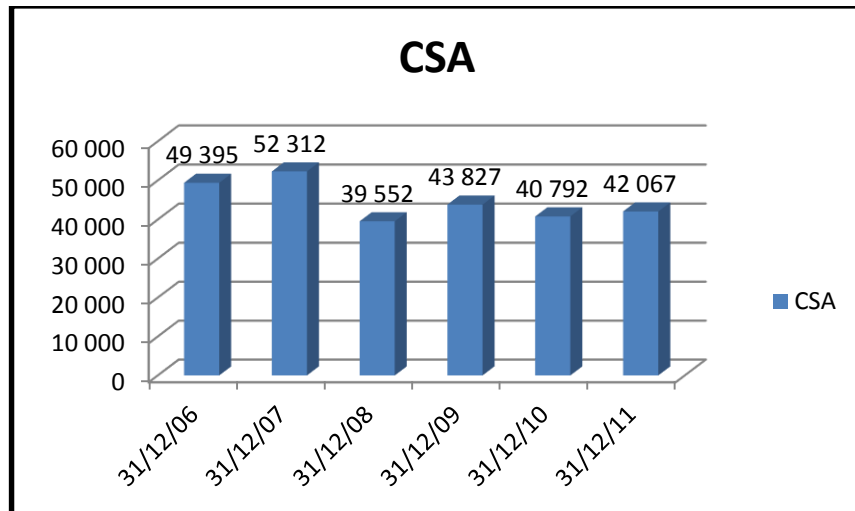


Figure 3 : progression des financements acquis du CSA de 2006 à 2011

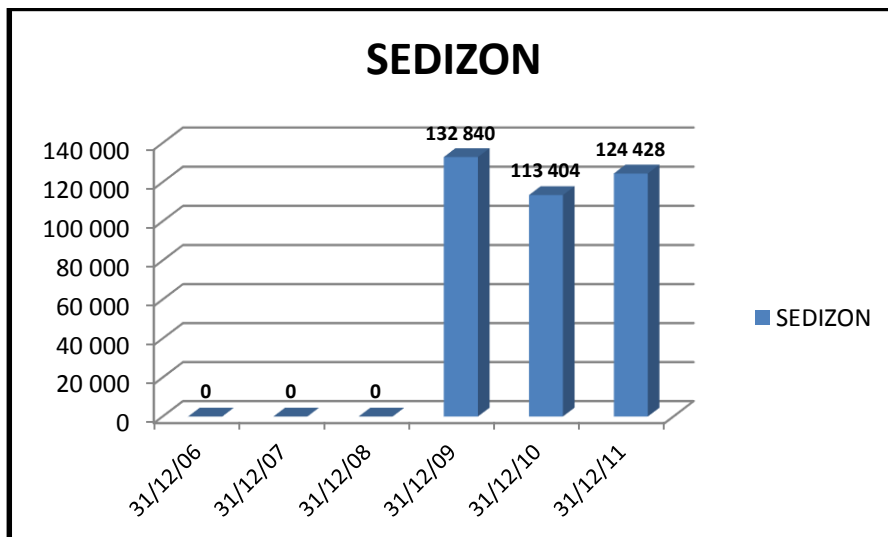


Figure 4 : progression des financements acquis du MDDIZON de 2006 à 2011

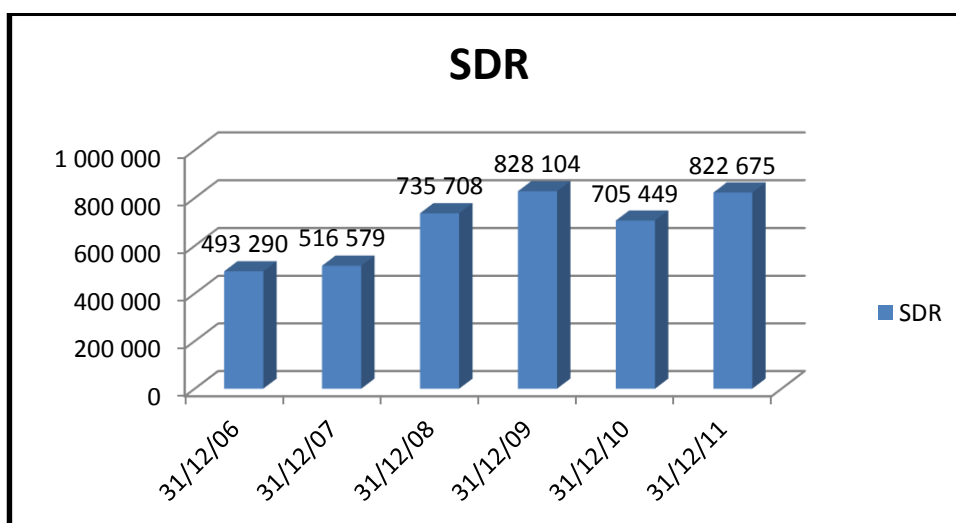


Figure 5 : progression des financements acquis du SDR de 2006 à 2011

2.3. Répartition des financements acquis:

L'objectif poursuivi est de présenter la répartition des financements afin d'offrir des éléments d'orientation pour le renforcement et la diversification des sources et des modes de financement du portefeuille.

2.3.1. Répartition du portefeuille par type de financement:

En millions Fcfa

Tableau 3 : répartition du portefeuille des PP par type de financement

Type de financement	SDR 2011	Taux en %
Prêt	433556	51%
Subvention	229422	27%
Financement intérieur	180592	21%
Total	843570	100%

Répartition du portefeuille du SDR par types de financement

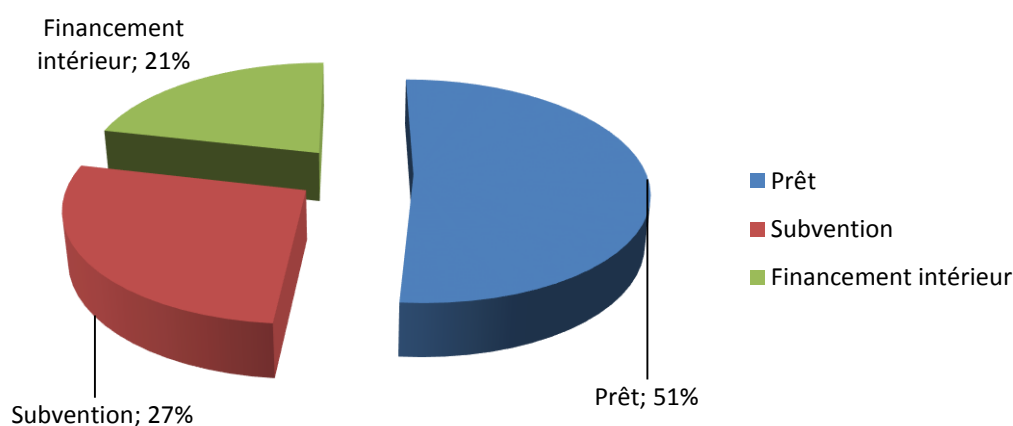


Figure 6: Répartition des financements acquis du portefeuille 2011

La figure N°2 ci-dessus montre que :

- Les 78% du portefeuille des projets et programmes sont assurés sur financement extérieur (prêts 51% et subventions 27%).
- L'engagement de l'Etat à travers le BSI est de 21% du volume total.

2.3.2. Evolution de la répartition du portefeuille par type de financement :

Tableau 4 : évolution de la répartition du portefeuille des P/P par type de financement

Type de financement	MA	MEP	CSA	MDDIZON	SDR
Prêt	19	10	0	5	34
Subvention	31	8	5	7	51
Financement intérieur	16	18	2	2	38
Mixte	1	0	2	0	3
Total	67	36	9	14	126

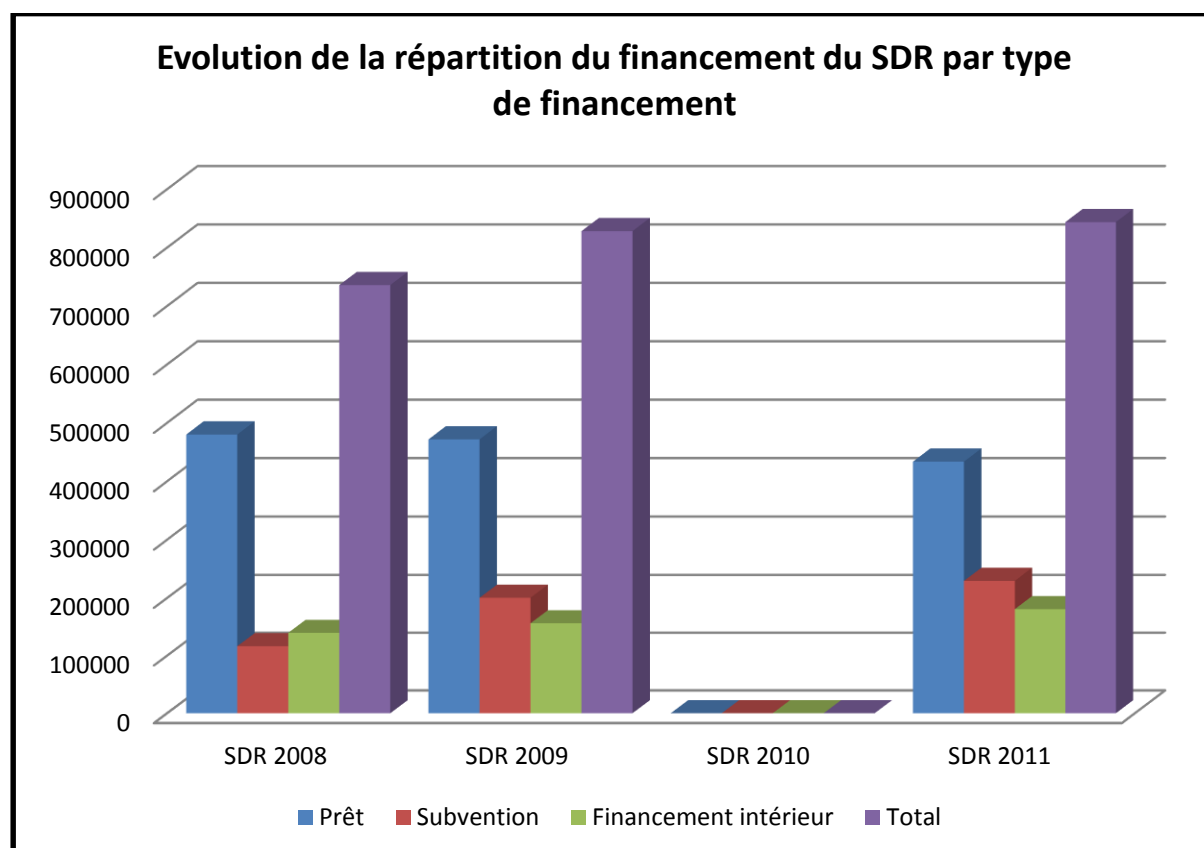


Figure 7 : évolution de la répartition du portefeuille par type de financement entre 2008 et 2011

2.4. Répartition des projets et programmes par tutelle

Au 31 décembre 2011, les projets et programmes du SDR sont répartis entre les structures de tutelle comme indiqué dans le tableau N° 6 ci-dessous :

Tableau 5 : Répartition des projets et programmes par structure du département

Nombre de P/P	MA	MEP	CSA	MDDIZON	SDR
En préparation	4	2	0	2	8
En exécution	63	34	9	12	118
Total	67	36	9	14	126
	53.2%	28.6%	7.1%	11.1%	100.0%

Sur les 126 projets répertoriés, 67 sont rattachés au MA, 36 au MEP, 9 au CSA et 14 au MDDIZON.

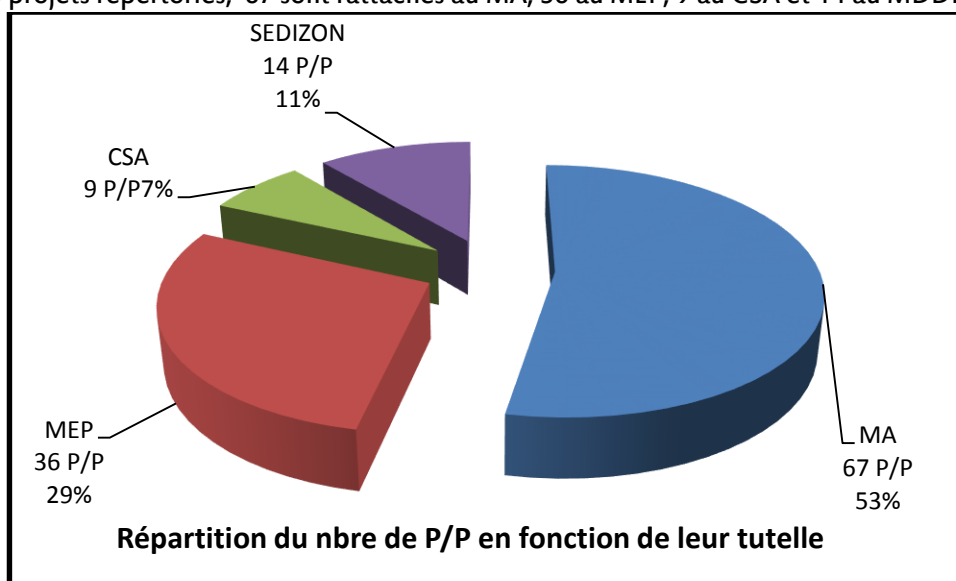


Figure 8 : répartition des P/P par tutelle

2.5. Répartition par tutelle des financements acquis des projets et programmes

2.5.1. Répartition des financements acquis 2010 par tutelle :

Au plan des financements acquis, le portefeuille des projets et programmes est réparti selon le tableau 8 ci dessous :

Tableau 6 : Répartition par tutelle des financements acquis des projets et programmes

Financement acquis cumulés 31/12/2011	MA	MEP	CSA	MDDIZON	SDR
Millions FCFA	543,498	112,682	42,067	124,428	822,675
%	66.1%	13.7%	5.1%	15.1%	100.0%

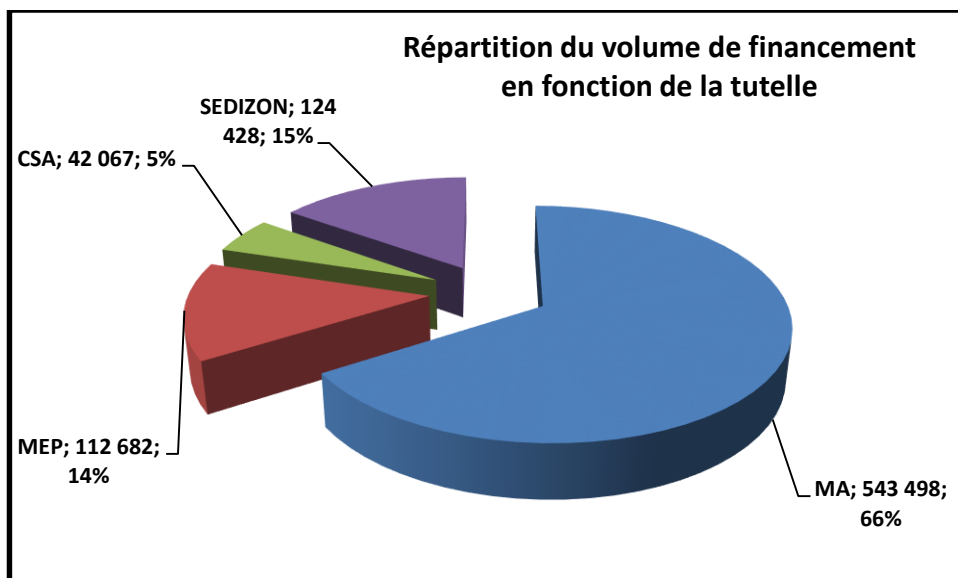


Figure 9 : Répartition des volumes de financement acquis des P/P du SDR par structure.

2.5.2. Evolution des financements acquis par tutelle de 2007 à 2010:

Tableau 7 : évolution des financements acquis cumulés de 2006 à 2011

Fin acquis cumulé	MA	MEP	CSA	MDDIZON	SDR
31/12/06	378,029	65,866	49,395	0	493,290
31/12/07	386,292	77,975	52,312	0	516,579
31/12/08	601,263	94,893	39,552	0	735,708
31/12/09	557,972	93,464	43,827	132,840	828,104
31/12/10	450,883	100,370	40,792	113,404	705,449
31/12/11	543,498	112,682	42,067	124,428	822,675

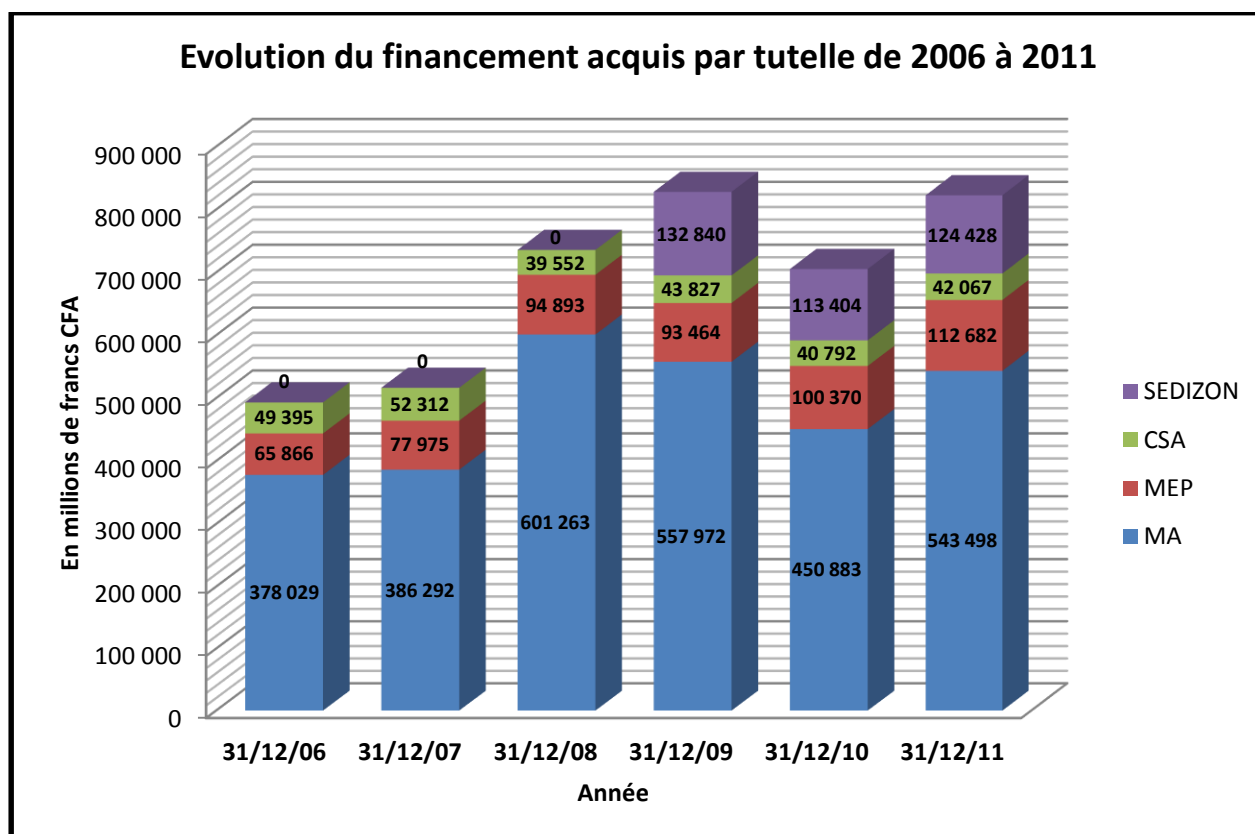


Figure 10 : évolution des financements acquis cumulés de 2006 à 2011 par tutelle

2.6. Répartition des P/P selon leur niveau d'exécution

Tableau 8 : répartition des P/P selon leur niveau d'exécution

	SDR	MA	MEP	CSA	MDDIZON
Exécution normale	64	32	24	4	4
Phase de transition	1	1	0		
Projet en préparation/démarrage	6	3	2		1
Retard d'exécution	23	13	8	2	
Non déterminé	32	18	2	3	9
Total	126	67	36	9	14

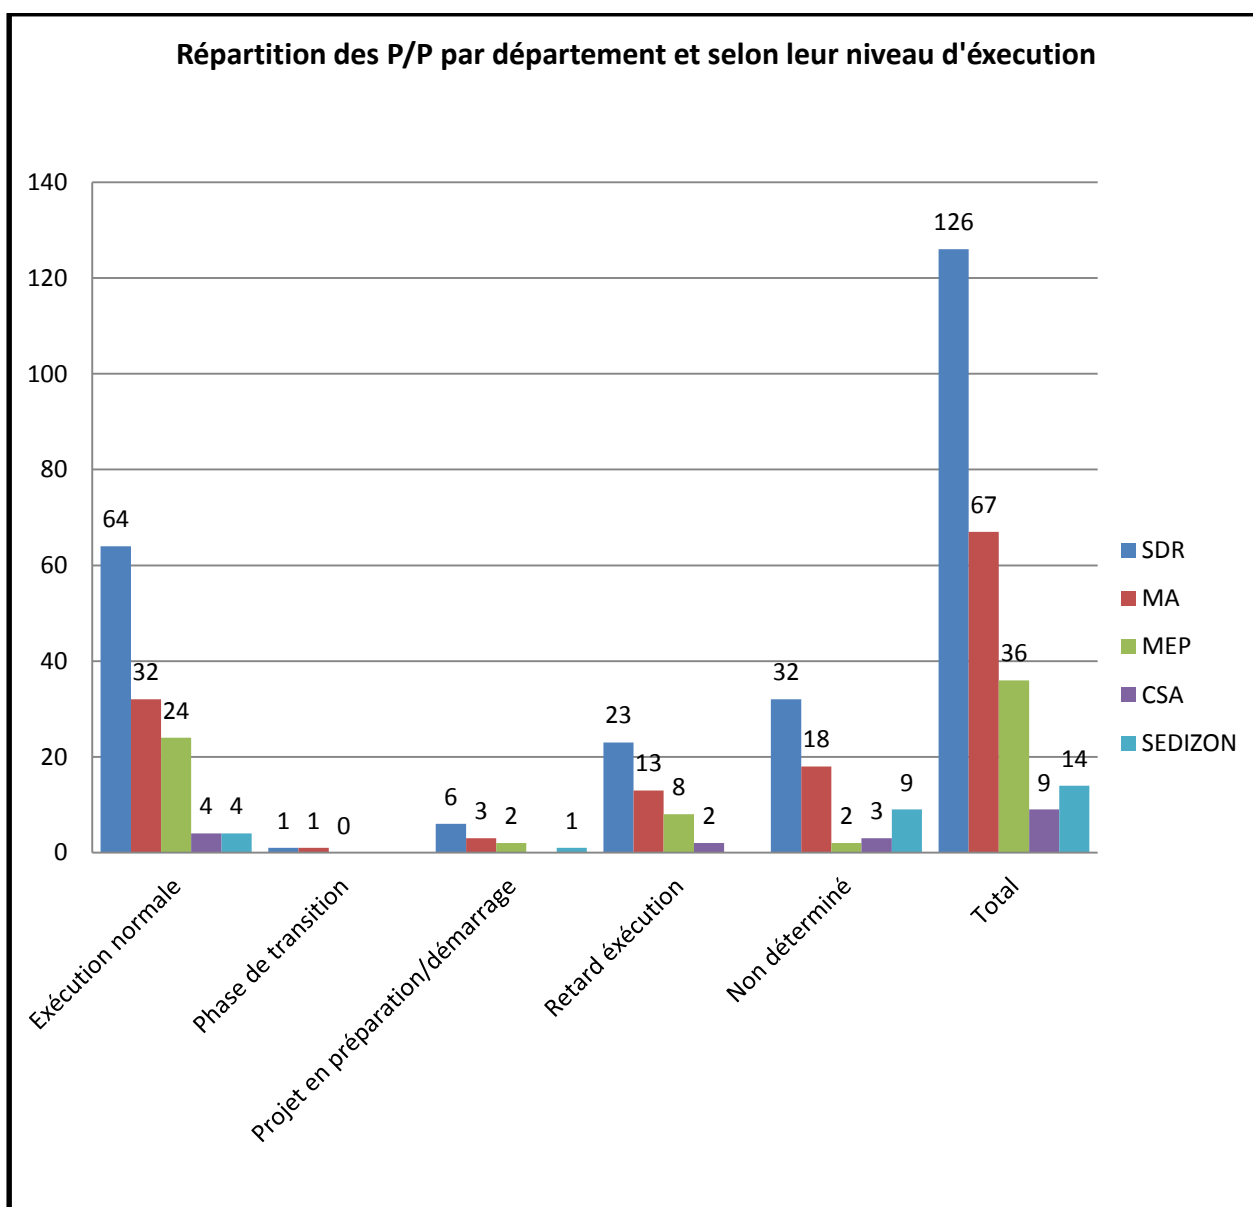


Figure 2 : répartition par département des P/P selon leur niveau d'exécution

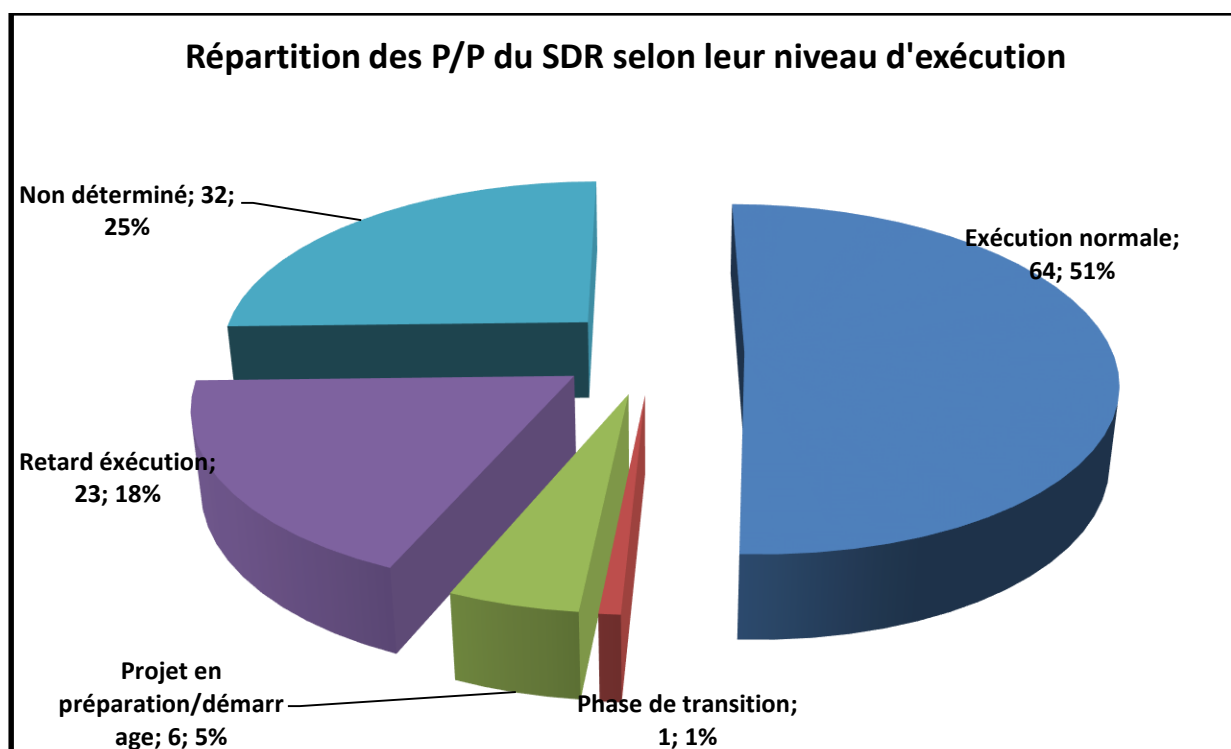


Figure 3 : répartition des P/P selon leur niveau d'exécution en %

51% contre 57% des projets en 2010 sont en exécution normale. 18% connaissent un retard dans l'exécution. 32 P/P soit 25% du portefeuille n'ont pas fournis les données pour cette 12^{ème} revue.

2.7. Situation des décaissements :

Le décaissement a été calculé pour les financements intérieurs et extérieurs. Cela permet de situer, en rapport avec l'âge et les taux de réalisation physique, la bonne évolution des projets. Pour y parvenir, la CPS a d'abord exploité les informations recueillies auprès des projets eux-mêmes au cours de visites de terrain.

Sur la base de ces informations, le montant total décaissé se chiffre à 349,844 milliards de Fcfa. Le taux de décaissement global est de 42,5 contre respectivement 37,7 % et 35,6% pour la 10^{ème} et la 9^{ème} revue.

Tableau 9 : Évolution des volumes de décaissement entre 2008 et 2011

Année	Intérieur	Extérieur	Total	PROGRESSION
2008	60583	147999	208582	-
2009	79417	215574	294992	41.4%
2010	84367	212643	297011	0.7%
2011	105351	244493	349844	17.8%

Nous notons une variation positive (17,8%) des volumes cumulés décaissés entre 2010 et 2011.

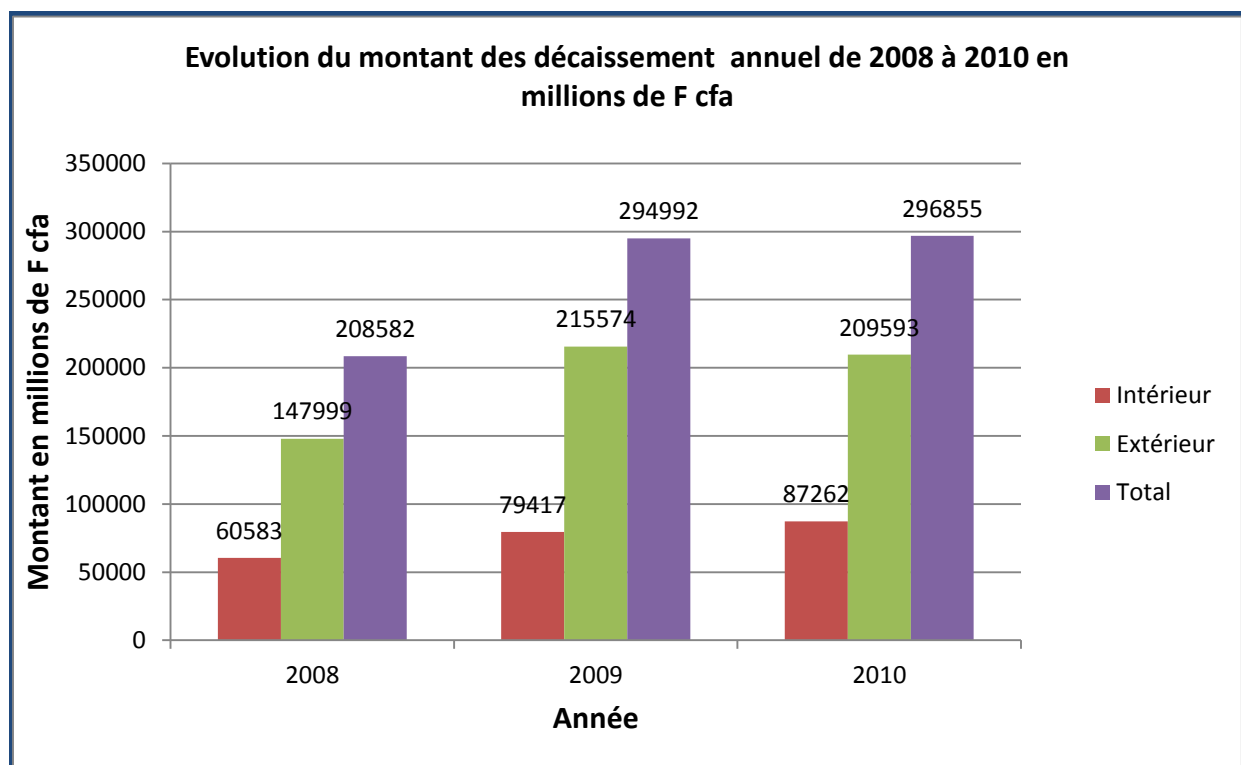


Figure 4 : Évolution des volumes de décaissement entre 2008 et 2010

2.7.1. Évolution du taux de décaissement entre 2008 et 2011

Tableau 10 : évolution du taux de décaissement de 2008 à 2009
SDR Global

Taux de décaissement	2008	2009	2010	2011	Evolution
Taux de décaissement Global MA	51,0%	41,9%	40,2%	45,1%	12,1%
Taux de décaissement Global MEP	24,0%	33,1%	45,4%	48,3%	6,3%
Taux de décaissement Global CSA	28,0%	17,5%	34,2%	44,8%	30,9%
Taux de décaissement Global MDDIZON	0,0%	17,1%	22,0%	25,5%	15,9%

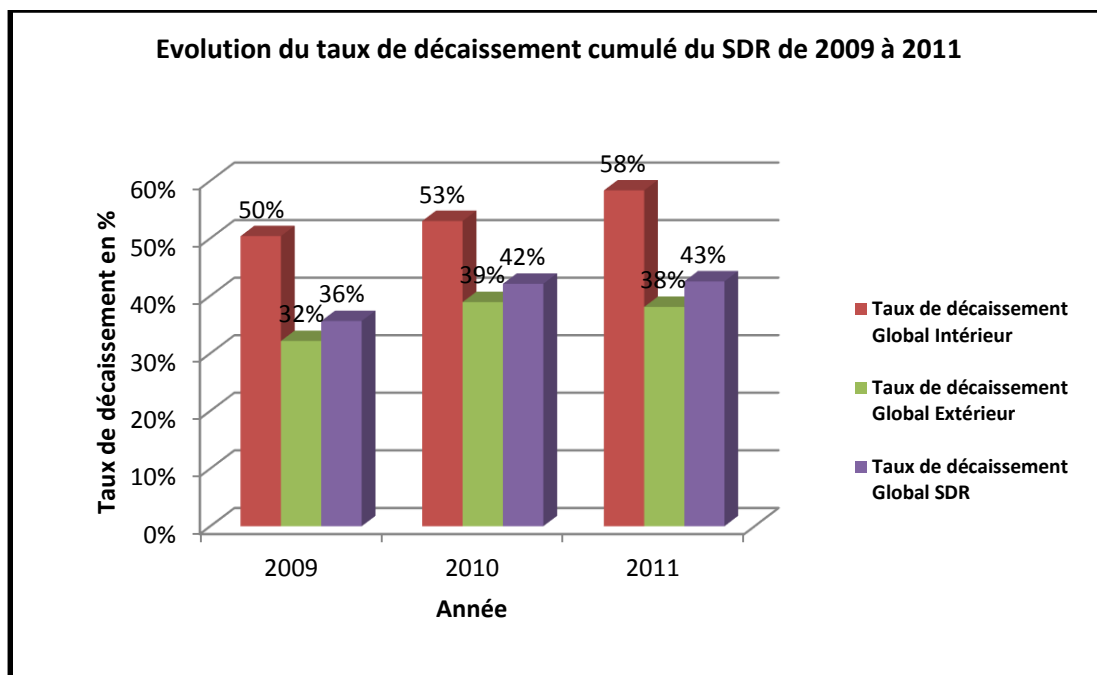


Figure 5 : évolution du taux de décaissement global entre 2008 et 2009

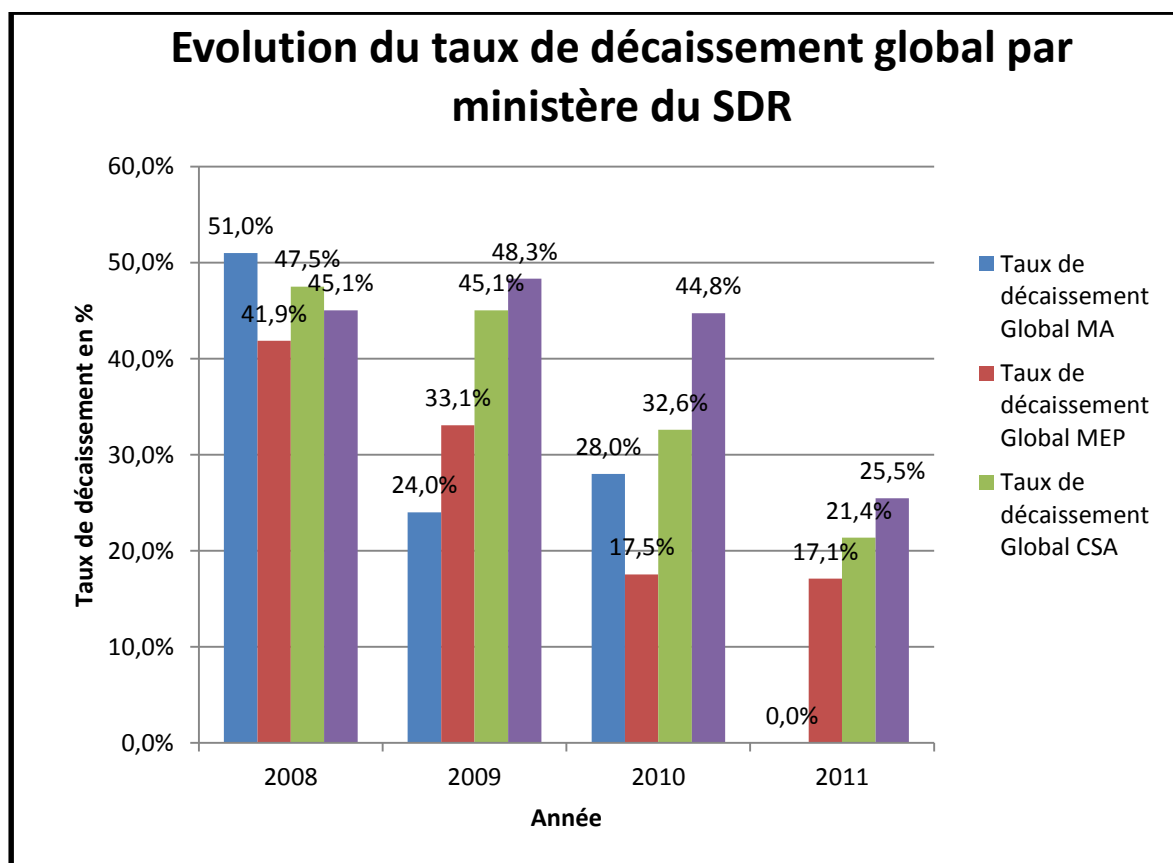
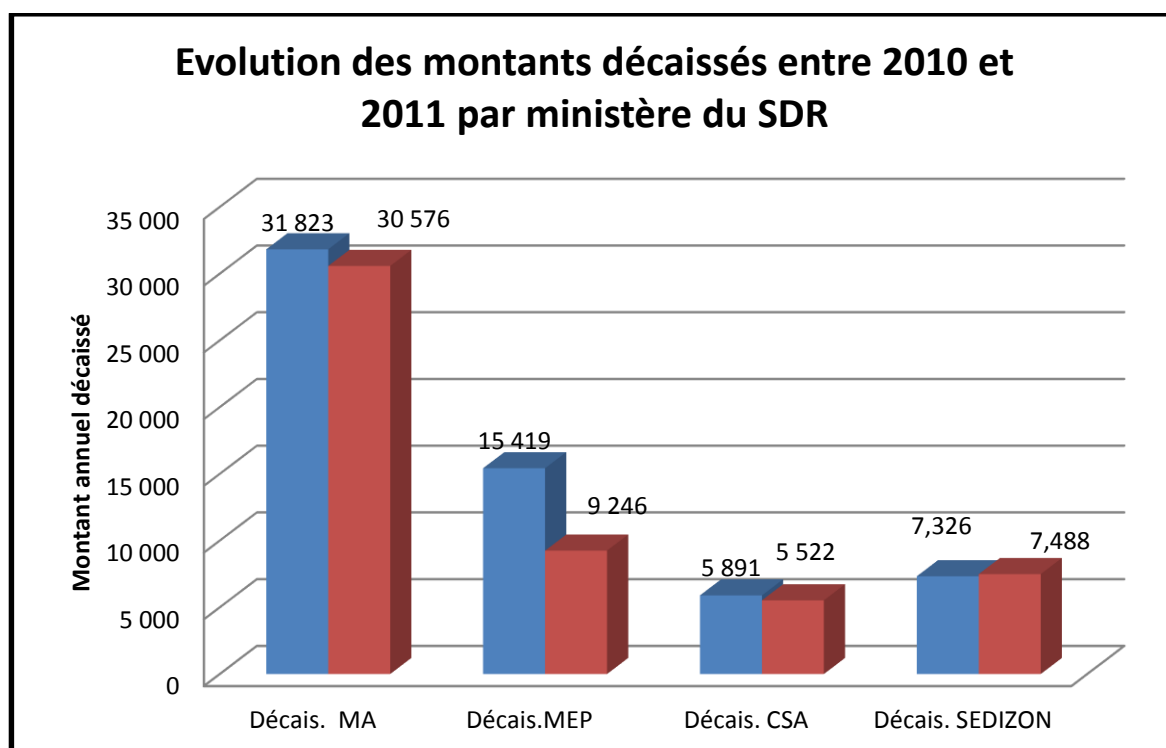


Figure 65 : évolution du taux de décaissement par département entre 2008 et 2011 en %

2.7.2. Décaissement 2009

Tableau 11 : décaissement cumulé au 31/12/2010 et décaissement 2010 par département

Décaissement	Cumulé	2010	Cumulé	2011
Décaissement MA	214,259	31,823	244,835	30,576
Décaissement MEP	45,213	15,419	54,459	9,246
Décaissement CSA	13,307	5,891	18,829	5,522
Décaissement MDDIZON	24,233	7,326	31,721	7,488
Décaissement SDR	297,011	60,459	349,844	52,833



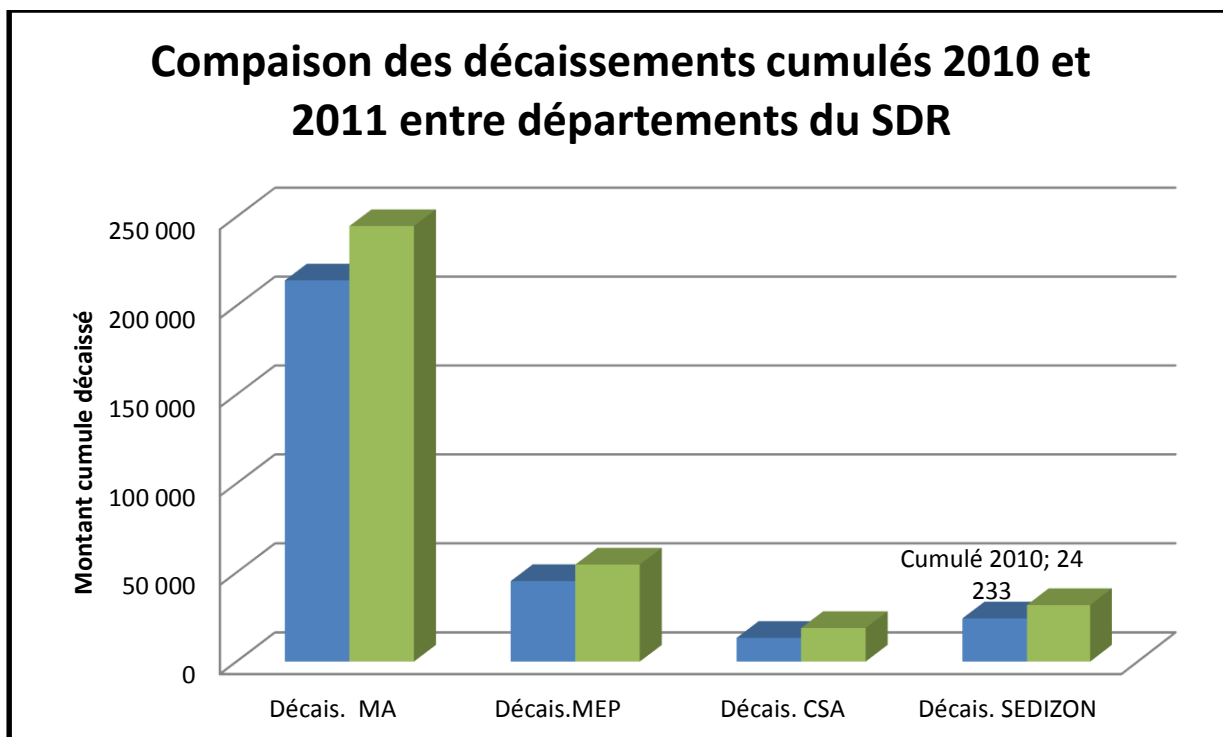


Figure 7 : comparaison du décaissement cumulé et décaissement 2010 entre département du SDR

2.7.3. Au titre du décaissement intérieur

Au 31 Décembre 2011, les projets et programmes du SDR revus enregistrent un décaissement cumulé de 349,804 milliard soit un taux global de 296,855 milliards de Fcfa, soit un taux 58,34% du financement intérieur acquis cumulés. Le taux de décaissement du financement intérieur est de 38,08% Le volume du décaissement intérieur est passé 105,351 milliards en 2011.

2.7.4. Au titre du décaissement extérieur

Le montant des décaissements extérieurs est de 244,493 milliards en 2011 contre 212,644 milliards en 2010. On constate une augmentation significative du montant des décaissements extérieurs par rapport à la revue précédente.

2.8. L'âge des P/P :

L'âge est compté par rapport à l'année 2011 (de la date de début de P/P au 31/12/2011).

La moyenne d'âge des 118 P/P du SDR en exécution est de 4 ans (3,57 ans).

Tableau 12 : l'âge des P/P

Age des P/P	MA	MEP	CSA	MDDIZON
Inférieur ou égale à 2 ans	27	15	5	9
comprise 3 et 5 ans	26	14	4	5
Supérieur à 5 ans	14	7	0	0
	67	36	9	14

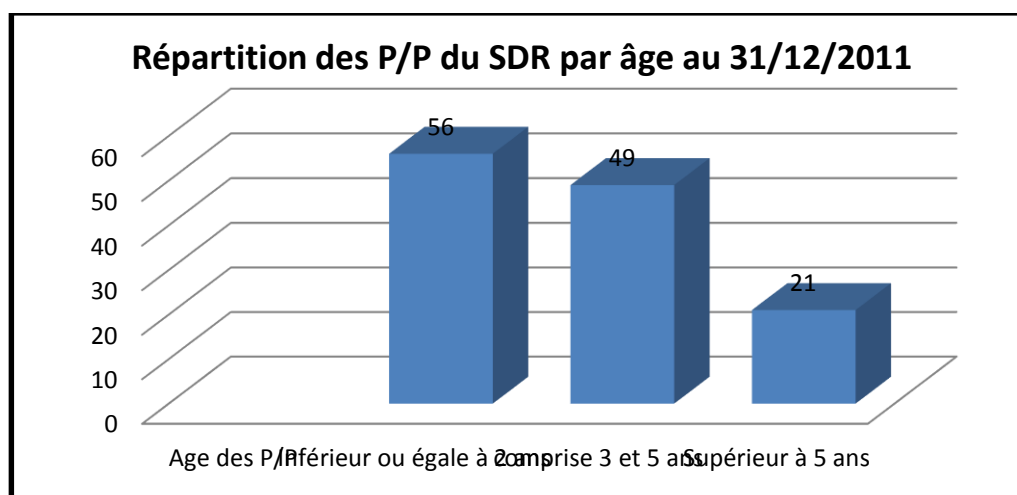
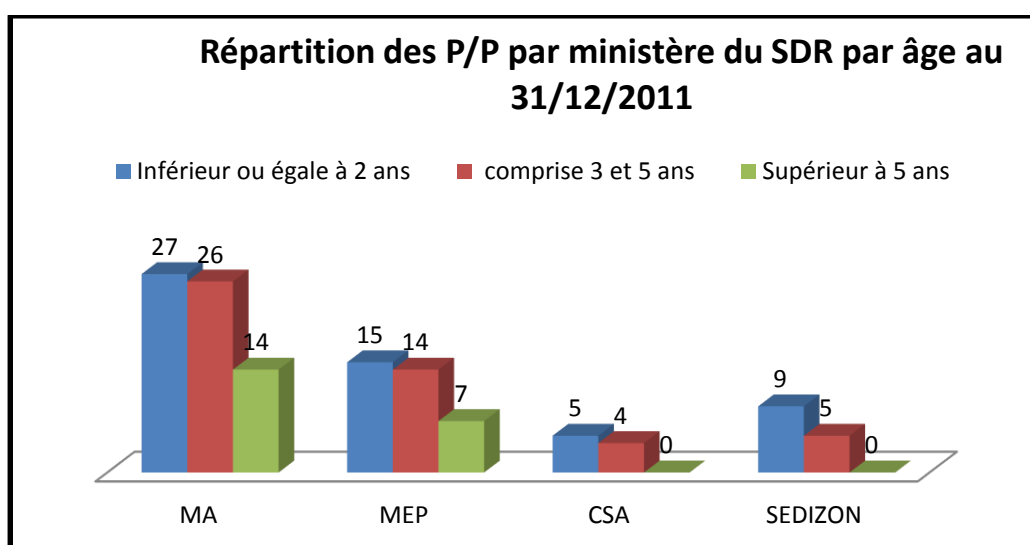


Figure 8 : répartition des P/P par âge

3. CONTRAINTES

Les contraintes rencontrées sont de plusieurs ordres. Elles sont récurrentes d'une revue à l'autre. Elles sont essentiellement les suivantes :

- Insuffisance d'allocations budgétaires pour le suivi des projets,
- Difficultés de mobilisation des ressources extérieures auprès de certains bailleurs de fonds
- Mise en œuvre par plusieurs projets des activités de suivi évaluation externe à l'insu de la CPS et inobservation de ses attributions ;
- Difficultés d'accès à l'information auprès de certains bailleurs de fonds, notamment en ce qui concerne les dépenses effectuées directement par eux,
- Insuffisances dans la maîtrise des procédures de passation des marchés. Le Circuit d'approbation est parfois très long,
- Faiblesse au niveau du remplissage des fiches (B.SI, revue) par certains gestionnaires et responsables des projets et programmes,
- Baisse des cours des devises (UC, Dollars, etc.),
- Défaillances des entreprises attributaires des marchés et leurs reprises.

4. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

Face à ces difficultés, les solutions envisagées peuvent se résumer aux points ci-après :

- Allouer les ressources budgétaires suffisantes pour le suivi des projets,
- Améliorer les procédures de mobilisation des ressources intérieures et extérieures,
- Impliquer la CPS/SDR dans les négociations de projets, dans la mobilisation des ressources et dans les Conseils d'Administration,
- Mettre en place un cadre de concertation approprié,
- Rationaliser les délais de traitement des dossiers en établissant un chronogramme engageant les deux parties (Mali/Bailleurs),
- Renforcer les capacités des responsables des projets en matière de procédures de passation des marchés,
- Financer les gaps occasionnés par la baisse des taux de change,

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La 10^{ème} revue des projets et programmes du Secteur du développement rural, organisée par la CPS/SDR, en rapport avec les DAF conformément aux instructions de la lettre N°19/MEIC du 06 Janvier 2009 du Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce, a porté sur 126 projets et programmes, dont 109 en exécution et 17 en préparation.

Le financement total acquis est d'environ 828,104 milliards de FCFA au 31 Décembre 2009.

Les recommandations suivantes peuvent être faites :

1. S'investir davantage en 2010 pour attirer de nouveaux investissements dans le SDR (partenaires multilatéraux et surtout bilatéraux).

6. ANNEXES

6.1. Annexe 1 : répartition des financements par projet/ programme par bailleur et par région

N° ordre	N° RNP	Intitulé des Projets et Programmes	Tutelle	Niveau d'exécution	Périodes		Dates mise en vigueur	Coûts du projet	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2011			Taux %			Bailleurs	Régions	Observations
					Début	Fin			Intér	Extér	Total	Intér 2	Extér3	Total4	Intér5	Extér6	Total7			
1	40	Progr Gouvernemental de 103 356 ha	MA	Exécution	2008	2012	01/07/07	6,000	4,000	0	4,000	2,611	0	2,611	65.3%	0.0%	65.3%	GRM	4	Exécution normale
2	116	Projet Aménagement Périmètre Irrigué Maninkoura (PAPIM)	MA	Exécution	2002	2012	18/02/02	16,949	6,627	10,322	16,949	5,895	10,220	16,115	89.0%	99.0%	95.1%	BAD / GRM	2	Retard exécution
3	307	Office Riz Mopti (Contrat- Plan)	MA	Exécution	2010	2012	1/1/2010	825	825	0	825	478	0	478	57.9%	#DIV/0!	57.9%	GRM	5	Exécution normale
4	559	Office Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)	MA	Exécution	2006	2012	2006	5,116	5,116	0	5,116	4,359	0	4,359	85.2%	#DIV/0!	85.2%	GRM	6	Exécution normale
	SN	Projet d'Appui à la Restauration du Système Faguibine PARF	MA	Exécution	2011	2012	01/01/11	2,386.00	-	2,386.00	2,386.00	-	581	581	#DIV/0!	24.4%	24.4%		6	Retard exécution
5	1,090	Projet de Développement des Ressources Halieutiques Lac Sélingué (PDRHLS)	MA	Exécution	2003	2012	3/11/2003	7,658	2,900	4,956	7,856	2,201	4,446	6,647	75.9%	89.7%	84.6%	BADEA / GRM	3	Exécution normale
6	2,380	Appui à la CPS	MA	Exécution	1996	2012	Jul-95	831	831	0	831	695	0	695	83.6%	#DIV/0!	83.6%	GRM	D	Exécution normale
7	1,429	Projet de développement agricole intégré plaine Saouné (PDAIS)	MA	Exécution	2010	2012	1/1/2010	210	210	0	210	123	0	123	58.6%	#DIV/0!	58.6%	GRM	6	Phase de transition
7	2,604	Projet d'aménagement des pistes de liaisons du périmètre de Banguinéda	MA	Exécution	2011	2012	7/1/2010	1,000	1,000	0	1,000	476	0	476	47.6%	#DIV/0!	47.6%	GRM	2	Préparation
8	1,539	Projet Appui Développement Rural plaines Daye,	MA	Exécution	2002	2012	12/17/2002	10,220	4,105	6,115	10,220	2,788	3,885	6,673	67.9%	63.5%	65.3%	BAD / GRM	6	Retard exécution

		Hamadja, Korioumé (PADR-PDHK)																			
9	1,659	Programme de Mise en Valeur Plaine Moyen-Bani (PMB)	MA	Exécution	1998	2011	12/31/1998	23,235	4,532	18,703	23,235	3,993	18,703	22,696	88.1%	100.0%	97.7%	Financement Commun / GRM	4	Exécution normale	
10	1,660	Projet Développement Intégré Aval Manantali (PDIAM)	MA	Exécution	2000	2013	16/08/1999 29/11/1998	19,217	4,833	14,384	19,217	2,863	12,049	14,912	59.2%	83.8%	77.6%	Financement Commun / GRM	1	Retard exécution	
11	1,661	Projet Aménagement PIV région GAO (PAPIV)	MA	Exécution	2007	2012		1,738	1,190	0	1,190	718	0	718	60.3%	#DIV/0!	60.3%	GRM	7	Exécution normale	
12	1,668	Projet développement Rural intégré Kita/PDRIK	MA	Exécution	2004	2012	1/2/2001	13,072	3,670	9,402	13,072	2,810	7,530	10,340	76.6%	80.1%	79.1%	Financement Commun / GRM	1	Retard exécution	
13	1,670	Projet Développement Rural Cercle Ansongo (PRODECA)	MA	Exécution	2001	2012	2/15/2001	11,519	3,692	7,827	11,519	3,240	7,200	10,440	87.8%	92.0%	90.6%	BAD / GRM	7	Retard exécution	
14	1,717	Projet Réhabilitation Périmètre hydro-agricole Baguinéda (Contrat Plan)	MA	Exécution	2009	2011	1/1/2009	772	772	0	772	708	0	708	91.7%	#DIV/0!	91.7%	GRM	2	Exécution normale	
15	1,779	Fonds de Développement en zone Sahélienne (FODESA)	MA	Exécution	2,009	2,013	2,009	15,957	587	15,370	15,957	525	13,642	14,167	89.4%	88.8%	88.8%	Financement Commun / GRM	2 4 5	Exécution normale	
16	1,882	Programme d'Appui au Développement de la Région de Mopti (PADER)	MA	Exécution	2002	2012	9/17/2002	19,984	5,700	14,284	19,984	3,965	10,988	14,953	69.6%	76.9%	74.8%	BAD / GRM	4;5	Exécution normale	
17	1,976	Projet Appui au Développement Activités Maraîchères Périurbaines Samanko (PADAP)	MA	Exécution	2008	2013	2006	2,186	515	1,671	2,186	250	1,280	1,530	48.5%	76.6%	70.0%	Belgique	2	Retard exécution	
18	1,977	Programme Compétitivité /Diversification Agricole (PCDA)	MA	Exécution	2006	2012	4/4/2006	24,174	1,034	23,200	24,234	981	18,000	18,981	94.9%	77.6%	78.3%	IDA (BM) / GRM	2, 3, 4, 5	Retard exécution	

19	1,983	Progr national des petits barrages et bas-fonds (PNPBBF)	MA	Exécution	2,004	2,013	/09/2004	9,848	7,140	2,858	9,998	4,990	2,858	7,848	1	1	1	Japon (KRII) / GRM	tttes régions	Exécution normale
20	2,109	Projet de Lutte contre le Criquet Pèlerin (PALUCP)	MA	Exécution	2005	2011	6/1/2005	6,333	1,220	5,113	6,333	1,220	5,113	6,333	100.0%	100.0%	100.0%	IDA (BM) / GRM	tttes régions	Exécution normale
21	2,110	Programme Appui Développement Yélimané (PADDY)	MA	Exécution	2005	2011	11/5/2005	7,348	1,219	6,129	7,348	963	2,507	3,470	79.0%	40.9%	47.2%	AFAK-VIETNAM / GRM	1	Retard exécution
22	2,158	Projet Renforcement Capacité Agriculture Durable Cinzana (PRECAD)	MA	Exécution	2006	2012	1/1/2006	1,675	400	1,275	1,675	239	749	988	59.8%	58.7%	59.0%	SYNGENTA Suisse / GRM	4	Exécution normale
23	2,159	Projet de Diffusion du Riz Nerica	MA	Exécution	2005	2012	2/5/2005	3,114	611	2,503	3,114	512	2,148	2,660	83.8%	85.8%	85.4%	BAD (FAD/FAT) / GRM	1,2,3	Exécution normale
24	2,571	Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture EAC	MA	Exécution	2011	2012	2010	600	600	0	600	300	0	300	50.0%	#DIV/0!	50.0%	GRM	tttes régions	Préparation
25	2,247	Mise en œuvre de la Loi d'Orientation Agricole (LOA)	MA	Exécution	2007	2012	2007	876	876	0	876	741	0	741	84.6%	#DIV/0!	84.6%	GRM	tttes régions	Exécution normale
26	2,249	Projet Intensification Périmètre Irrigué Baguinéda (PIB)	MA	Exécution	2,007	2,012		16,096	4,785	11,311	16,096	2,820	11,311	14,131	1	1	1	BAD / GRM	2	Exécution normale
27	2,250	Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-OHVN)	MA	Exécution	2011	2013	11/15/2011	1,282	700	0	700	303	0	303	43.3%	#DIV/0!	43.3%	GRM	2	Exécution normale
28	2,274	Projet d'Aménagement Hydroagricole Petits Périmètres Irrigués Villageois Sélingué (PPIV ODRS)	MA	Exécution	2007	2012	6/29/2007	1,250	1,250	0	1,250	747	0	747	59.8%	#DIV/0!	59.8%	GRM	3	Données non disponibles
29	2,306	Projet d'Appui au renforcement moyens de protection végétaux et denrées stockées région Liptako Gourma (PVLG)	MA	Exécution	2008	2011	11/11/2007	1,469	169	1,300	1,469	32	34	66	18.9%	2.6%	4.5%	BADEA / GRM	5,6,7,8,D	Données non disponibles
30	2,307	Projet Appui Filière Coton Textile / Volet Mali (PAFICOT-Mali)	MA	Exécution	2008	2012	2/12/2008	8,601	968	7,633	8,601	562	1,811	2,373	58.0%	23.7%	27.6%	BAD / GRM	1, 2, 3, 4	Retard exécution

31	2,3 67	Projet étude aménagement petits barrages Ségou	MA	Exécution	2008	2012	6/1/2008	827	3,097	0	3,097	1,607	0	1,607	51.9%	#DIV/0!	51.9%	GRM	4	Exécution normale
32	2,8 74	Projet Appui Développement Filière Pourghère Mali (PADFP-Mali)	MA	Exécution	2008	2012	2008	785	225	0	225	150	0	150	66.7%	#DIV/0!	66.7%	GRM	1, 2, 3, 4, 5	Retard exécution
33	2,3 71	Programme d'Appui au Secteur Agricole au Mali (PASAM)	MA	Exécution	2008	2012	10/1/2007	13,893	693	13,200	13,893	414	4,675	5,089	59.7%	35.4%	36.6%	Danemark / GRM	5	Exécution normale
34	2,4 57	Coordination Nationale Projets Mali/FAO/Venezuela /Espagne pour Sécurité Alimentaire	MA	Exécution	2007	2012	6/30/1905	3,920	552	3,368	3,920	138	2,410	2,548	25.0%	71.6%	65.0%	Venez/Es pag/FAO/GRM	1,2,5,7	Données non disponibles
35	2,4 81	Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA	MA	Exécution	2010	2012		1,010	1,010	0	1,010	865	0	865	85.6%	#DIV/0!	85.6%	GRM	D Bamako	Exécution normale
36	SN	Programme Appui Unités Production Diversification Agricole Kéniéba (PAUPK)	MA	Exécution	2008	2011	Fév. 2008	309	30	275	305	30	269	299	100.0%	97.8%	98.0%	Financement Commun / GRM	1	Données non disponibles
37	SN	Projet Irrigation de Proximité au Pays Dogon et dans le Bélé Dougou IPRO-BD	MA	Exécution	2009	2012	1er aout 2009	5,515	0	5,515	5,515	0	1,237	1,237	#DIV/0!	22.4%	22.4%	Allemagne / KFW	2, 5	Données non disponibles
38	SN	Prog. De Développement Economique et Rural Région de Koulikoro (DERK)	MA	Exécution	2005	2012	6/3/2005	5,239	0	5,239	5,239	0	5,206	5,206	#DIV/0!	99.4%	99.4%	Pays Bas	2	Exécution normale
39	2,2 45	Projet d'Appui à Filière Blé Région Tombouctou (Projet-Alkama)	MA	Exécution	2008	2013	4/18/2008	3,059	392	2,667	3,059	201	954	1,155	51.3%	35.8%	37.8%	Belgique	6	Données non disponibles
40	SN	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) ou WAAPP	MA	Exécution	2008	2012	3/21/2008	7,413	0	7,413	7,413	0	6,586	6,586	#DIV/0!	88.8%	88.8%	IDA (BM)	ttes régions	Exécution normale
41	2,4 80	Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI BS)	MA	Exécution	2010	2015	11/18/2009	120,000	7,600	86,815	94,415	807	5,252	6,059	10.6%	6.0%	6.4%	Financement Commun / GRM	2,4,5	Exécution normale

43	SN	Projet d'Appui au Sous Secteur de l'Irrigation de Proximité (PASSIP); Phase préparatoire	MA	Exécution	2008	2023	6/1/2008	7,570		7,570	7,570	0	4,104	4,104	#DIV/0!	54.2%	54.2%	Allemagne / GTZ	tttes régions	Exécution normale
44	SN	Projet Gestion Intégrée Ressources en Eau usages multiples fleuve Sénégal (PGIRE)	MA	Exécution	2007	2011	Feb-07	6,500		6,500	6,500	0	1,112	1,112	#DIV/0!	17.1%	17.1%	IDA (BM)	1	Retard exécution
45	2,672	Projet Développement Intégré Wassoulou (PDIW)	MA	Exécution	2008	2012		297	120	227	347	70	68	138	58.3%	29.8%	39.7%	BOAD / GRM	3, D	Données non disponibles
46	SN	Projet d'Appui aux Filières Agricoles PAFA	MA	Exécution	2008	2015	Feb-09	5,332		5,332	5,332	0	679	679	#DIV/0!	12.7%	12.7%	Canada	1, 2, 3,4 et D Bko	Données non disponibles
47	SN	Programme Mali-Nord (IPRODI)	MA	Exécution	2009		Apr-08	19,540		12,922	12,922	0	3,870	3,870	#DIV/0!	29.9%	29.9%	Allemagne / KFW	6, 5	Données non disponibles
48	SN	Projet de plan de passage à l'approche sectorielle	MA	Exécution	2009	2011	Sep-09	3,505		3,505	3,505	0	631	631	#DIV/0!	18.0%	18.0%	Financement Commun / GRM	tttes régions	Données non disponibles
49	SN	Prog. Appui Irrigation de proximité PAIP	MA	Exécution	2009	2012	Mar-09	9,500		9,500	9,500		4,558	4,558	#DIV/0!	48.0%	48.0%	Canada	tttes rég°	Données non disponibles
50	SN	Projet Renforcement Capacités Organisations producteurs de Coton	MA	Exécution	2007	2011	9/9/2007	539	0	539	539	0	523	523	#DIV/0!	97.0%	97.0%	IDA (Don japonais)	1,2,3,4	Données non disponibles
51	2,523	Projet Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon de valorisation productions maraichères	MA	Exécution	2008	2012	Mar-08	2,277	170	2,107	2,277	95	1,306	1,401	55.9%	62.0%	61.5%	Italie	5, 7	Exécution normale
52	2,560	Construction/Equipm t Inspection de l'Agriculture	MA	Exécution	2011	2012	Jul-10	300	300	0	300	76	0	76	25.3%	#DIV/0!	25.3%	GRM	D Bamako	Exécution normale

53	SN	Progr Sécurité Alimentaire zone de concentration Sud (PROSA)	MA	Exécution	2008	2012	8/1/2008	2,515	219	2,296	2,515	10	629	639	4.6%	27.4%	25.4%	Luxembourg, Bénéficiaires	3 4	Données non disponibles
54	SN	Professionnelles Agricoles pour la Commercialisation des Céréales au Mali (FASO JIGI / PACCEM)	MA	Exécution	2009	2011	Jul-05	210	0	159	159	0	95	95	#DIV/0!	59.7%	59.7%	FCD Canada	tttes régions	Données non disponibles
55	SN	Projet d'Appui à la Stratégie Nationale pour le Développement de l'Irrigation (Kayes)	MA	Exécution	2007	2010	Oct-07	927	0	927	927	0	927	927	#DIV/0!	100.0%	100.0%	Espagne	1	Données non disponibles
56	2,606	Programme Microfinance Rural PMR	MA	Exécution	2010	2017	Aug-10	15,657	1,886	12,748	14,634	121	952	1,073	6.4%	7.5%	7.3%	FIDA	2;3;4;5;6	Exécution normale
58	SN	Projet Renforcement de la gouvernance de la filière Coton dans le cadre de la réforme institutionnelle et d'amélioration de la productivité de la durabilité et d'exploitation en zone cotonnière (PASE II)	MA	Préparation	2011	2014	2007	13,119	0	7,216	7,216	0	0	0	#DIV/0!	0.0%	0.0%	France (AFD)	1,2,3,4	Données non disponibles
59	SN	Projet Gomme Arabique	MA	Préparation	2010						0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Espagne	3	Données non disponibles
60	SN	Projet d'Appui à la Productivité Agricole du Mali (PAPAM)	MA	Exécution	2010	2014	12/19/2010	82,925	11,850	71,075	82,925	0	4,800	4,800	0.0%	6.8%	5.8%	Financement Commun / GRM	tttes régions	Exécution normale
	2,658	Projet de Renforcement des Capacités des services en Agriculture	MA	Préparation	2012	2012	juillet 2011	250	250	0	250			0	0.0%	#DIV/0!	0.0%	GRM	Toutes Régions	Projet en démarrage

61	SN	Projet pour la mise en place d'un nœud national « Système National d'Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances » (SAKSS)	MA	Préparation	2010	2012	2010	588	0	588	588				#DIV/0!	0.0%	0.0%	IITA	tes régions	Données non disponibles
62	SN	Création de richesse et souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso à travers le développement des marchés locaux pour la transformation locale de l'anacarde (PCTARS)	MA	Exécution	2010	2014	25/07/10	4,757	0	4,757	4,757	0	821	821	#DIV/0!	17.3%	17.3%	Espagne	3	Exécution normale
	SN	Renforcer et implanter le système de contrôle des engrais au Mali	MA	Exécution	2,010	2,012	40,609	200	0	200	200	0	102	102	#DIV/0!	1	1	AGRA	Toutes Régions	Exécution normale
	SN	Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (GCP/MLI/033/FDC)	MA	Exécution	2,011	2,015	39804	3303	0	2107	2107	0	11	11	#DIV/0!	0	0	FAO	1,2,4,5	Retard exécution
	SN	Amélioration à la production du riz en Afrique de l'ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires APRAO (GCP/RAF/453/SPA)	MA	Exécution	2,011	2012	40655	2914	0	248	248	134		134	#DIV/0!	0	1	FAO	1,2,3,4,5	Exécution normale
	SN	Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face aux changements climatiques dans le	MA	Exécution	2010	2014	Jun-10	1,570.00		1,270.00	1,270.00		177.00	177.00	#DIV/0!	0	0	FEM / GEF	1,2,3,4,5,7	Exécution normale

		secteur agricole du Mali																			
63	141	Projet Appui au Développement Elevage Mali Nord-Est (PADENEM) Phase II	MEP	Exécution	2003	2012	11/5/2003	14,634	2,259	12,375	14,634	2,181	8,786	10,967	96.5%	71.0%	74.9%	BAD (FAD) / GRM	7	Retard exécution	
64	501	Projet de Développement Aviculture au Mali (PDAM)	MEP	Exécution	1998	2012	7/16/1998	2,008	2,008	0	2,008	1,752	0	1,752	87.3%	#DIV /0!	87.3%	GRM	1,2,3,4,5 et DB	Exécution normale	
65	1,881	Projet Gestion Durable Bétail Ruminant Endémique / BAD	MEP	Exécution	2008	2013	Mar-08	5,944	1,021	4,923	5,944	697	1,005	1,702	68.3%	20.4%	28.6%	BAD / FEM / GRM	1, 2, 3	Retard exécution	
66	1,885	Programme Développement Intégré Réduction Pauvreté Zone ONDY (PDRIP)/PPTE	MEP	Exécution	2003	2012	2003	1,126	1,126	0	1,126	1,035	0	1,035	91.9%	#DIV /0!	91.9%	GRM	3	Exécution normale	
67	1,891	Projet Appui Amélioration Conditions de Vie des Pauvres et couches Vulnérables en Zone Lacustre (PAACVP)	MEP	Exécution	2003	2012	Mar-03	1,667	1,667	0	1,667	1,384	0	1,384	83.0%	#DIV /0!	83.0%	GRM	6	Exécution normale	
68	1,894	Programme Panafricain contrôle épizooties PACE	MEP	Exécution	2000	2012	7/1/2000	1,247	1,247	0	1,247	965	0	965	77.4%	#DIV /0!	77.4%	GRM	tes régions	Exécution normale	
69	1,984	Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)	MEP	Exécution	2005	2012	3-Feb-05	9880	3,585	6,986	10,571	2,783	2,539	5,322	77.6%	36.3%	50.3%	BID / GRM	5, 6, 7	Retard exécution	
71	2,117	Projet Multinational Création Zones libérées Durablement de la Mouche Tsé Tsé et de la Trypanosomiase en	MEP	Exécution	2006	2013	4-Feb-05	5990	1,054	4,936	5,990	750	936	1,686	1	0	0	BAD / GRM	2,4,D	Retard exécution	

		Afrique de l'Ouest et de l'Est PATTEC																		
72	2,1 18	Projet Régional Amélioration Qualité Cuir et Peaux	MEP	Exécution	200 4	2011	5/18/200 4	456	456	0	456	430	0	430	94.3%	#DIV /0!	94.3%	GRM	1,2,3,4 5 D	Exécution normale
73	2,1 19	Réhabilitation Centre Piscicole Molodo	MEP	Exécution	200 6	2011	Jul-05	717	717	0	717	668	0	628	93.2%	#DIV /0!	87.6%	GRM	4	Exécution normale
74	2,1 41	Projet Sélection et Multiplication ZEBU AZAWAK (phase II)	MEP	Exécution	200 6	2011	3/23/200 6	2,138	614	1,524	2,138	476	1,524	2,000	77.5%	100. 0%	93.5%	Belgique / GRM	7	Exécution normale
75	2,1 93	Projet Appui Pêche Continentale Zone Delta Central Niger (PADEPECHE Mopti)	MEP	Exécution	200 6	2012	12/27/20 05	15,053	3,23 0	11,823	15,053	2,46 5	5,805	8,270	76.3%	49.1 %	54.9%	BAD / GRM	5, 6	Exécution normale
76	2,1 98	Construct° / Equip. Infrast. Commercial. & Transfor. Betail	MEP	Exécution	200 7	2012	Jul-06	797	797	0	797	665	0	665	83.4%	#DIV /0!	83.4%	GRM	ttes régions	Exécution normale
77	2,1 99	Lutte C/ Péri Pneumonie Contagieuse Bovine	MEP	Exécution	200 6	2012	5/31/200 6	1,235	1,23 5	0	1,235	996	0	996	80.6%	#DIV /0!	80.6%	GRM	ttes régions	Exécution normale
78	2,2 00	Contrat Plan Etat - LCV	MEP	Exécution	201 1	2013	Jul-10	450	264	0	264	114	0	114	43.2%	#DIV /0!	43.2%	GRM	ttes régions	Exécution normale
79	22 01	Transformation Sous Produits Abattages	MEP	Exécution	200 6	2012	7/5/1996	1,590	805	785	1,590	597	25	622	74.2%	3.2%	39.1%	BADEA / GRM	D, 2	Exécution normale
80	2,4 01	Programme d'Appui au Développement Durable de l'Elevage au Sahel Occidental	MEP	Exécution	200 9	2012	11/5/200 8	13,317	833	1,844	2,677	660	1,376	2,036	79.2%	74.6 %	76.1%	OPEP	1,2,4	Exécution normale
81	23 20	Programme quinquennal Aménagements Aquacoles	MEP	Exécution	200 8	2012	2007	13,960	1,93 8	0	1,938	1,41 1	0	1,411	72.8%	#DIV /0!	72.8%	GRM	ttes régions	Exécution normale
82	23 21	Programme quinquennal Aménagements Pastoraux	MEP	Exécution	200 8	2012	7/1/2007	22,631	1,22 5	0	1,225	870	0	870	71.0%	#DIV /0!	71.0%	GRM	ttes régions	Exécution normale
83	2,3 22	Projet Appui Développement Elevage Zone Kayes Sud	MEP	Exécution	200 8	2013	1/10/200 8	14,569	3,33 3	11,238	14,571	1,90 0	2,616	4,516	57.0%	23.3 %	31.0%	BAD / GRM	1	Retard exécution

84	23 23	Programme développement Pêche et Pisciculture zone OHVN	MEP	Exécution	2007	2012	Jul-07	1,318	580	738	1,318	304	640	944	52.4%	86.7%	71.6%	Japon / GRM	2	Exécution normale
85	24 02	Construction marché central poisson Bamako	MEP	Exécution	2009	2011	Jul-10	5,832	600	5,232	5,832	569	0	569	94.8%	0.0%	9.8%	Japon / GRM	D	Données non disponibles
86	24 03	Construction réhabilitation Centre Formation Pratique Elevage	MEP	Exécution	2009	2012	Jul-08	750	750		750	514		514	68.5%	#DIV/0!	68.5%	GRM	D	Exécution normale
87	24 04	Projet développement et valorisation production laitière au Mali (PRODEVALAIT)	MEP	Exécution	2009	2013	Jul-08	15,776	2,400	0	2,400	1,626	0	1,626	67.8%	#DIV/0!	67.8%	GRM	ttés régions	Retard exécution
89	SN	Plan D'action de Lutte contre la Grippe Aviaire (PALCGA)	MEP	Exécution	2008	2012	2/22/2007	1,312	0	1,312	1,312	0	639	639	#DIV/0!	48.7%	48.7%	Union Européenne	ttés régions	Exécution normale
90	26 37	Progr. Gouvernemental d'aménagement de 60000 ha (office du niger)	SEDI ZON	Préparation	2012	2012	juillet 2011	300	300	0	300	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	0.0%	GRM	4	Projet en démarrage
91	SN	Plan d'intervention d'urgence/BAD	MEP	Exécution	2007	2009	2,007	132	0	132	132	0	75	75	#DIV/0!	57.1%	57.1%	BAD	ttés régions	Données non disponibles
92	18 96	Projet de lutte contre les mouches tsé tsé et les trypanosomoses animales PLMT	MEP	Exécution	2009	2012	8/8/2008	1,110	685	0	685	429	0	429	62.6%	#DIV/0!	62.6%	GRM	3	Retard exécution
93	26 55	Réhabilitation équipement DNPIA / DRPIA	MEP	Préparation	2012	2012	juillet 2011	250	250	0	250	0	0	0	0	#DIV/0!	0.0%	GRM	ttés régions	Projet en démarrage
94	25 42	Programme quinquennal de lutte contre la fièvre aphteuse au Mali	MEP	Exécution	2011	2015	01/07/10	3,131	250	0	250	150	0	150	0.6	#DIV/0!	1	GRM	ttés régions	Exécution normale
95	SN	Projet d'Appui à la Sélection et à la Multiplication ZEBU AZAWAK Phase III	MEP	Préparation	2012	2015		1,640	0	1,640	1,640	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Belgique / GRM	7	Projet en démarrage

96	24 88	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara PRODEZEM	MEP	Exécution	2010	2015	03/02/10	5,772	525	5,247	5,772	119	654	773	22.7%	12.5%	13.4%	Belgique / GRM	2	Retard exécution
97	24 89	Construction Equipement Inspection Elevage Pêche	MEP	Exécution	2010	2012	01/07/09	570	570	0	570	417		417	73.2%	#DIV/0!	73.2%	GRM	D	Exécution normale
98	25 54	Construction Equipmt CADD/MEP	MEP	Exécution	2011	2012	01/07/10	300	300	0	300	136	0	136	45.3%	#DIV/0!	45.3%	GRM	D Bamako	Exécution normale
99	25 43	Programme de lutte contre la grippe aviaire	MEP	Exécution	2011	2012	01/07/10	100	100		100	50	0	50	50.0%	#DIV/0!	50.0%	GRM	D Bamako	Exécution normale
100	25 76	Aménagement Extention DFM MEP	MEP	Exécution	2011	2012	01/07/10	650	650		650	450	0	450	69.2%	#DIV/0!	69.2%	GRM	D Bamako	Exécution normale
101	26 43	Projet d'Appui au Développement de la Filière Aquacole dans la région de Sikasso PRODEFA	MEP	Exécution	2011	2016	03/12/2010	4,873	904	3,969	4,873	0	276	276	0.0%	7.0%	5.7%	Belgique / GRM	3	Exécution normale
102	13 69	Contrat plan Programme Restructuration du Marché Céréaliier (PRMC)	CSA	Exécution	2009	2,011	01/01/09	4,300	4,300	0	4,300	3,112	0	3112		#DIV/0!	0.72372093	GRM	Ttes Rég	Exécution normale
103	1,3 69	Programme Restructuration du Marché Céréaliier (PRMC) + participation PTF	CSA	Exécution	2009	2012	01/01/09	508	0	508	508	0	74	74	#DIV/0!	14.6%	14.6%	GRM	Ttes Rég	Exécution normale
104	1,8 98	Réhabilitation extension infrastructures stockage PAM (Programme pays chq 5 ans)	CSA	Exécution	2008	2012	30/06/08	545	275	0	275	110	0	110	40.0%	#DIV/0!	40.0%	GRM	Toutes Régions	Retard exécution
105	21 02	Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord Mali (PIDRN)	CSA	Exécution	2,006	2,013	10/04/2006 18/09/06	18,269	512	15,643	16,155	314	9829	10143	0.61328125	0.628332	0.62785515	Financement Commun / GRM	6 7	Exécution normale

106	2369	Programme Intégré Développement Rural Région Kidal (PIDRK)	CSA	Exécution	2,007	2,014	07/07/07	12,427	2,133	10,294	12,427	299	3323	3622	0.14017815	0.322809	0.29146214	Financement Commun / GRM	8	Retard exécution
107	SN	Programme conjoint d'amélioration de la nutrition alimentaire dans le cercle de Bandiagara	CSA	Exécution	2,009	2,012	17/11/09	3,500	0	3,500	3500	0	1500	1500	#DIV/0!	0.428571	0.42857143	PNUD / FAO	5	Exécution normale
108	SN	Projet d'appui à la sécurité alimentaire	CSA	Exécution	2010	2012	02/07/05	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	#DIV/0!	0.0%	0.0%	Belgique (FBS)	1,2,5	Données non disponibles
109	SN	Programme National de sécurité Alimentaire	CSA	Exécution	2006	2010	28/06/05	88		88	88		88	88	#DIV/0!	100.0%	100.0%	Belgique (FBS)	Ttes Rég	Données non disponibles
110	SN	Initiative d'accélération des OMD au Mali (l. 166 communes)	CSA	Exécution	2009	2011	01/03/09	936,000		314	314		179	179	#DIV/0!	57.1%	57.1%	PNUD	1,2,4,5,6,7,8	Données non disponibles
111	1007	Office Riz -Ségou (6 ^{ème} contrat plan)	SEDI ZON	Exécution	2,009	2,011	39,600	2,520	2,520	0	2520	1905	0	1905	0.75595238	#DIV/0!	0.75595238	GRM	4	Exécution normale
112	SN	Programme d'appui à la mise en œuvre du contrat plan office du Niger (PAMOCP-ON)	SEDI ZON	Exécution	2010	2016	Apr-10	19,679	0	19,679	19,679		1,277	1,277	#DIV/0!	6.5%	6.5%	Union Européenne	4	Exécution normale
113	1,706	Entretien, aménagement infrastructures et vulgarisation ON (Contrat Plan)	SEDI ZON	Exécution	2008	2012	Jan-08	21,244	21,244	0	21,244	12,023	0	12,023	56.6%	#DIV/0!	56.6%	GRM	4	Données non disponibles
114	SN	Projet d'appui à l'ON pour l'amélioration de sa gouvernance/ HELEN ON	SEDI ZON	Exécution	2008	2011	11/12/2008	1,768	0	1,768	1,768	0	1,497	1,497	#DIV/0!	84.7%	84.7%	Pays Bas	4	Données non disponibles
115	SN	Programme d'Appui au Contrat Plan Office du Niger (PACOP)	SEDI ZON	Exécution	2009	2011	Nov-09	3,159	0	3,159	3,159	0	770	770	#DIV/0!	24.4%	24.4%	Pays Bas	4	Données non disponibles
116	1,981	Aménagement Hydro-agricole M'Béwani Bloc D/ON	SEDI ZON	Exécution	2006	2012	6/16/2005	7,565	2,815	4,750	7,565	1,460	3,970	5,430	51.9%	83.6%	71.8%	BOAD / GRM	4	Données non disponibles

117	2,308	Aménagement 1950 Ha de N'Débougou III ON	SEDI ZON	Exécution	2007	2011	16/12/2005	7,971	100	7,871	7,971	100	4,668	4,768	100.0%	59.3%	59.8%	Allemagne (KFW) / GRM	4	Données non disponibles
116	SN	Projet d'Appui au Développement de l'Office du Niger (PADON)	SEDI ZON	Exécution	2006	2010	1/13/2006	6,559	0	6,559	6,559	0	2,268	2,268	#DIV/0!	34.6%	34.6%	France (AFD)	4	Données non disponibles
18	2484	Projet d'appui au développement rural de Tien Konou (PADER-TKT)	SEDI ZON	Exécution	2,009	2,013	40,148	14,985	3955	11030	14985	414	708	1122	0.10467762	0.064189	0.07487487	BID / GRM	4	Exécution normale
118	SN	Valorisation du potentiel agricole de la zone de N'Débougou (projet KIE)	SEDI ZON	Exécution	2011	2014	1/22/2008	5,647	400	5,247	5,647	0	98	98	0.0%	1.9%	1.7%	Allemagne (KFW) / GRM	4	Données non disponibles
119	2,602	Projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord	SEDI ZON	Exécution	2010	2015	6/22/2010	9,280	1,280	8,000	9,280	225	240	465	17.6%	3.0%	5.0%	BOAD	4	Exécution normale
120	SN	Projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord Extension	SEDI ZON	Préparation	2011	2015	pas en vigueur	13,592	1,333	12,259	13,592	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	BOAD	4	Données non disponibles
121	2,585	Projet d'irrigation plaine de SIENGO (projet extension de 1670 ha de Siengo)	SEDI ZON	Exécution	2,010	2,015	25 /3/2009	10,160	976	9,183	10,159	0	98	98	0	0	0	Allemagne (KFW) / GRM	4	Données non disponibles
120	126		126		126			1,865,297	180,592	642,084	822,676	105,351	244,493	349,804	58.3%	38.1%	42.5%		126	126

